



# Управление объектами капитальных вложений и формирование адресных инвестиционных программ (АИП)


**МИХАЙЛОВА**  
**Наталья Дмитриевна**

Старший бизнес-аналитик департамента  
систем бюджетного планирования



## Программный комплекс «АИП-СМАРТ»

Программный комплекс предназначен для автоматизации процессов формирования и реализации адресной инвестиционной программы



### Для кого:

- Органы государственной власти
- Муниципальные учреждения
- Финансовые органы
- Экономические ведомства
- Органы управления строительством и инфраструктурой

# Регламентирующий НПА

Автоматизация процессов формирования  
и реализации АИП с учетом  
**Постановления от 30 мая 2024 г. № 702**  
**«Об управлении капитальными вложениями»**



## Этапы формирования



# Функциональные возможности ПК «АИП-СМАРТ»

- ✔ Единое информационное пространство для всех участников
- ✔ Интерактивный рабочий стол пользователя
- ✔ Формирование паспорта объекта капитального строительства
- ✔ Настройка гибких прав доступа к мониторингу контрольных точек объектов для оперативного отображения процесса реализации и предотвращения возможностей появления рисков



## Плавательный бассейн в г. Шарыпово

Паспорт объекта

Мониторинг КТ

Редактировать



**1,09 млн ₽**  
План

**756 тыс. ₽**  
Факт

**17**  
КТ (кол-во)

**Даты:** 01.01.2020-31.12.2024

**Мощность:** 4,49 тыс. Квадратный метр

**Адрес:** Красноярский Край,  
Город Шарыпово,  
Микрорайон 4-й


**Стоимость:** 30 млн ₽

**Отрасль:** Спорт

**Нацпроект:**

Контрольные точки	Отклонения	Плановая дата окончания	Фактическая дата окончания
Установка технологического оборудования, в том числе Поставка и установка оборудования	достигнуто	31.12.2024	19.12.2024
Установка технологического оборудования, в том числе Заключение государственного контракта на поставку оборудования	достигнуто	31.12.2024	23.12.2024
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	достигнуто	25.12.2024	04.12.2024
СМР завершены	просрочено на 8 дней	20.12.2024	28.12.2024
Получение заключения органа государственного строительного надзора	просрочено на 1 дней	20.12.2024	21.12.2024
Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	просрочено на 82 дней	01.10.2024	22.12.2024
Подписание графика производства работ	просрочено на 62 дней	06.04.2023	07.06.2023
Начало работ	просрочено на 62 дней	06.04.2023	07.06.2023
Установка технологического оборудования, в том числе Разработка технического задания к Закупке	просрочено на 197 дней	01.03.2023	14.09.2023


Финансирование в разрезе ИФ

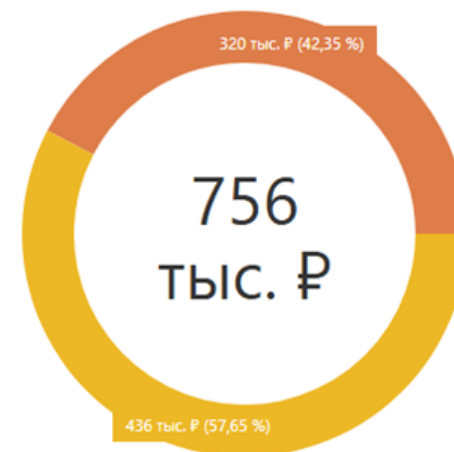

# Функциональные возможности ПК «АИП-СМАРТ»

- ✔ Ведение единого реестра объектов собственности
- ✔ Привязка объектов к государственным программам, проектам, отраслям
- ✔ Встроенная карта объектов
- ✔ Цветовая индикация этапов строительства
- ✔ Финансовый мониторинг освоения бюджетных средств
- ✔ Отчет об исполнении перечня объектов



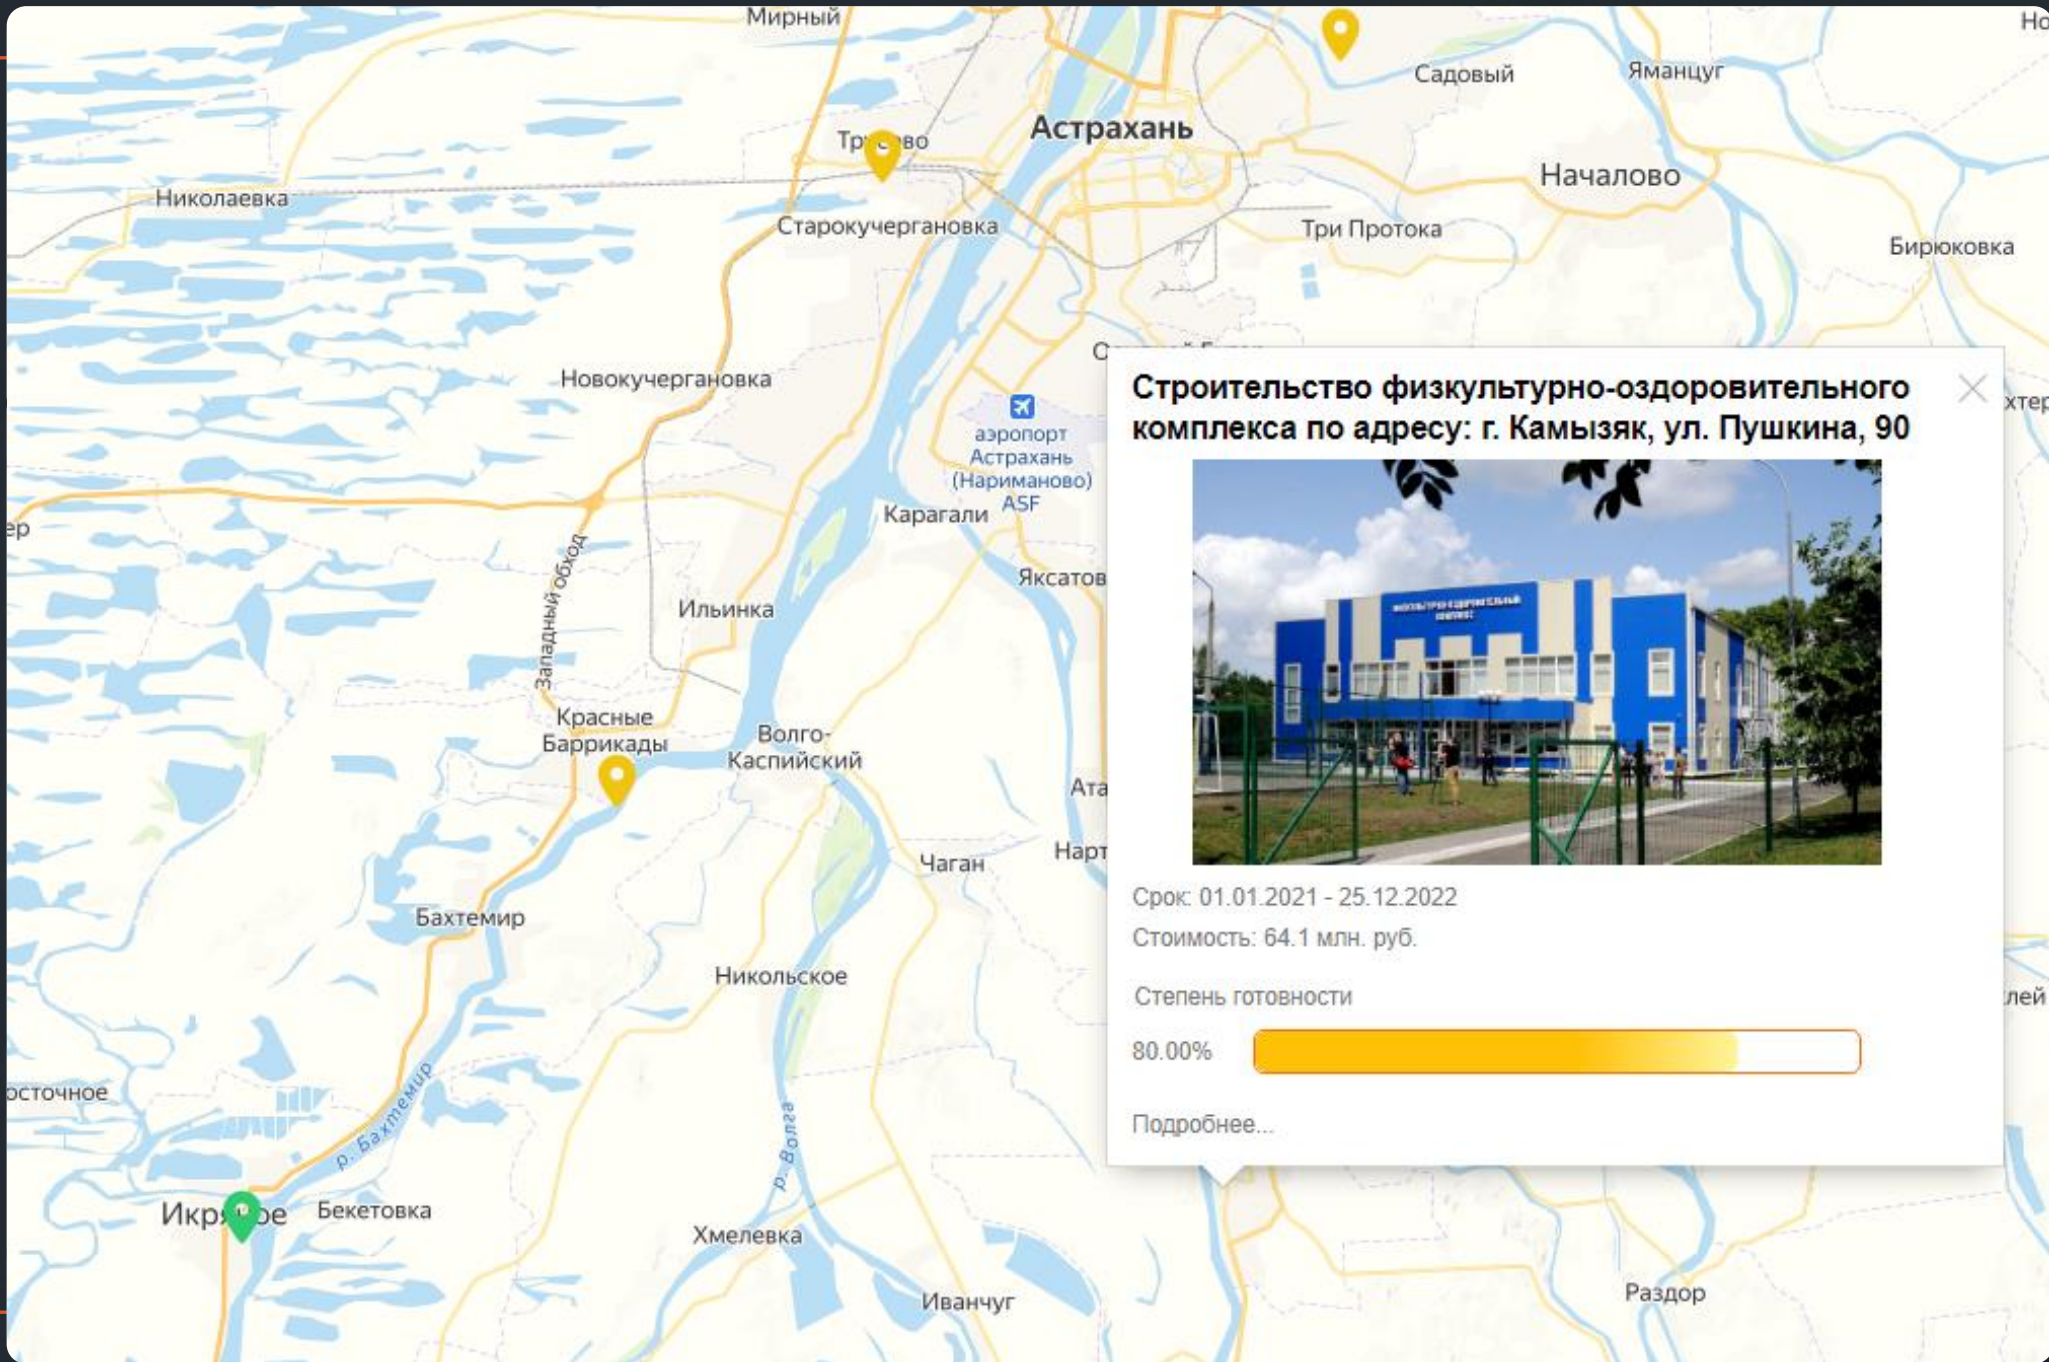

**Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Камызяк, ул. Пушкина, 90**



Срок: 01.01.2021 - 25.12.2022

Стоимость: 64.1 млн. руб.

Степень готовности

80.00%




[Подробнее...](#)

# Функциональные возможности ПК «АИП-СМАРТ»

- ✔ Формирование ОБАСов в разрезе объектов в системе планирования бюджета
- ✔ Автоматическая загрузка финансового обеспечения с учетом всех уровней бюджетной классификации и дополнительными справочниками источников финансирования из системы исполнения бюджета
- ✔ Актуальная информация на всех этапах планирования, размещения и исполнения контрактов путем получения данных в режиме онлайн из системы управления закупками
- ✔ Контроль и аналитика в реальном времени всех финансовых и качественных показателей для оперативных управленческих решений



# Единое информационное пространство

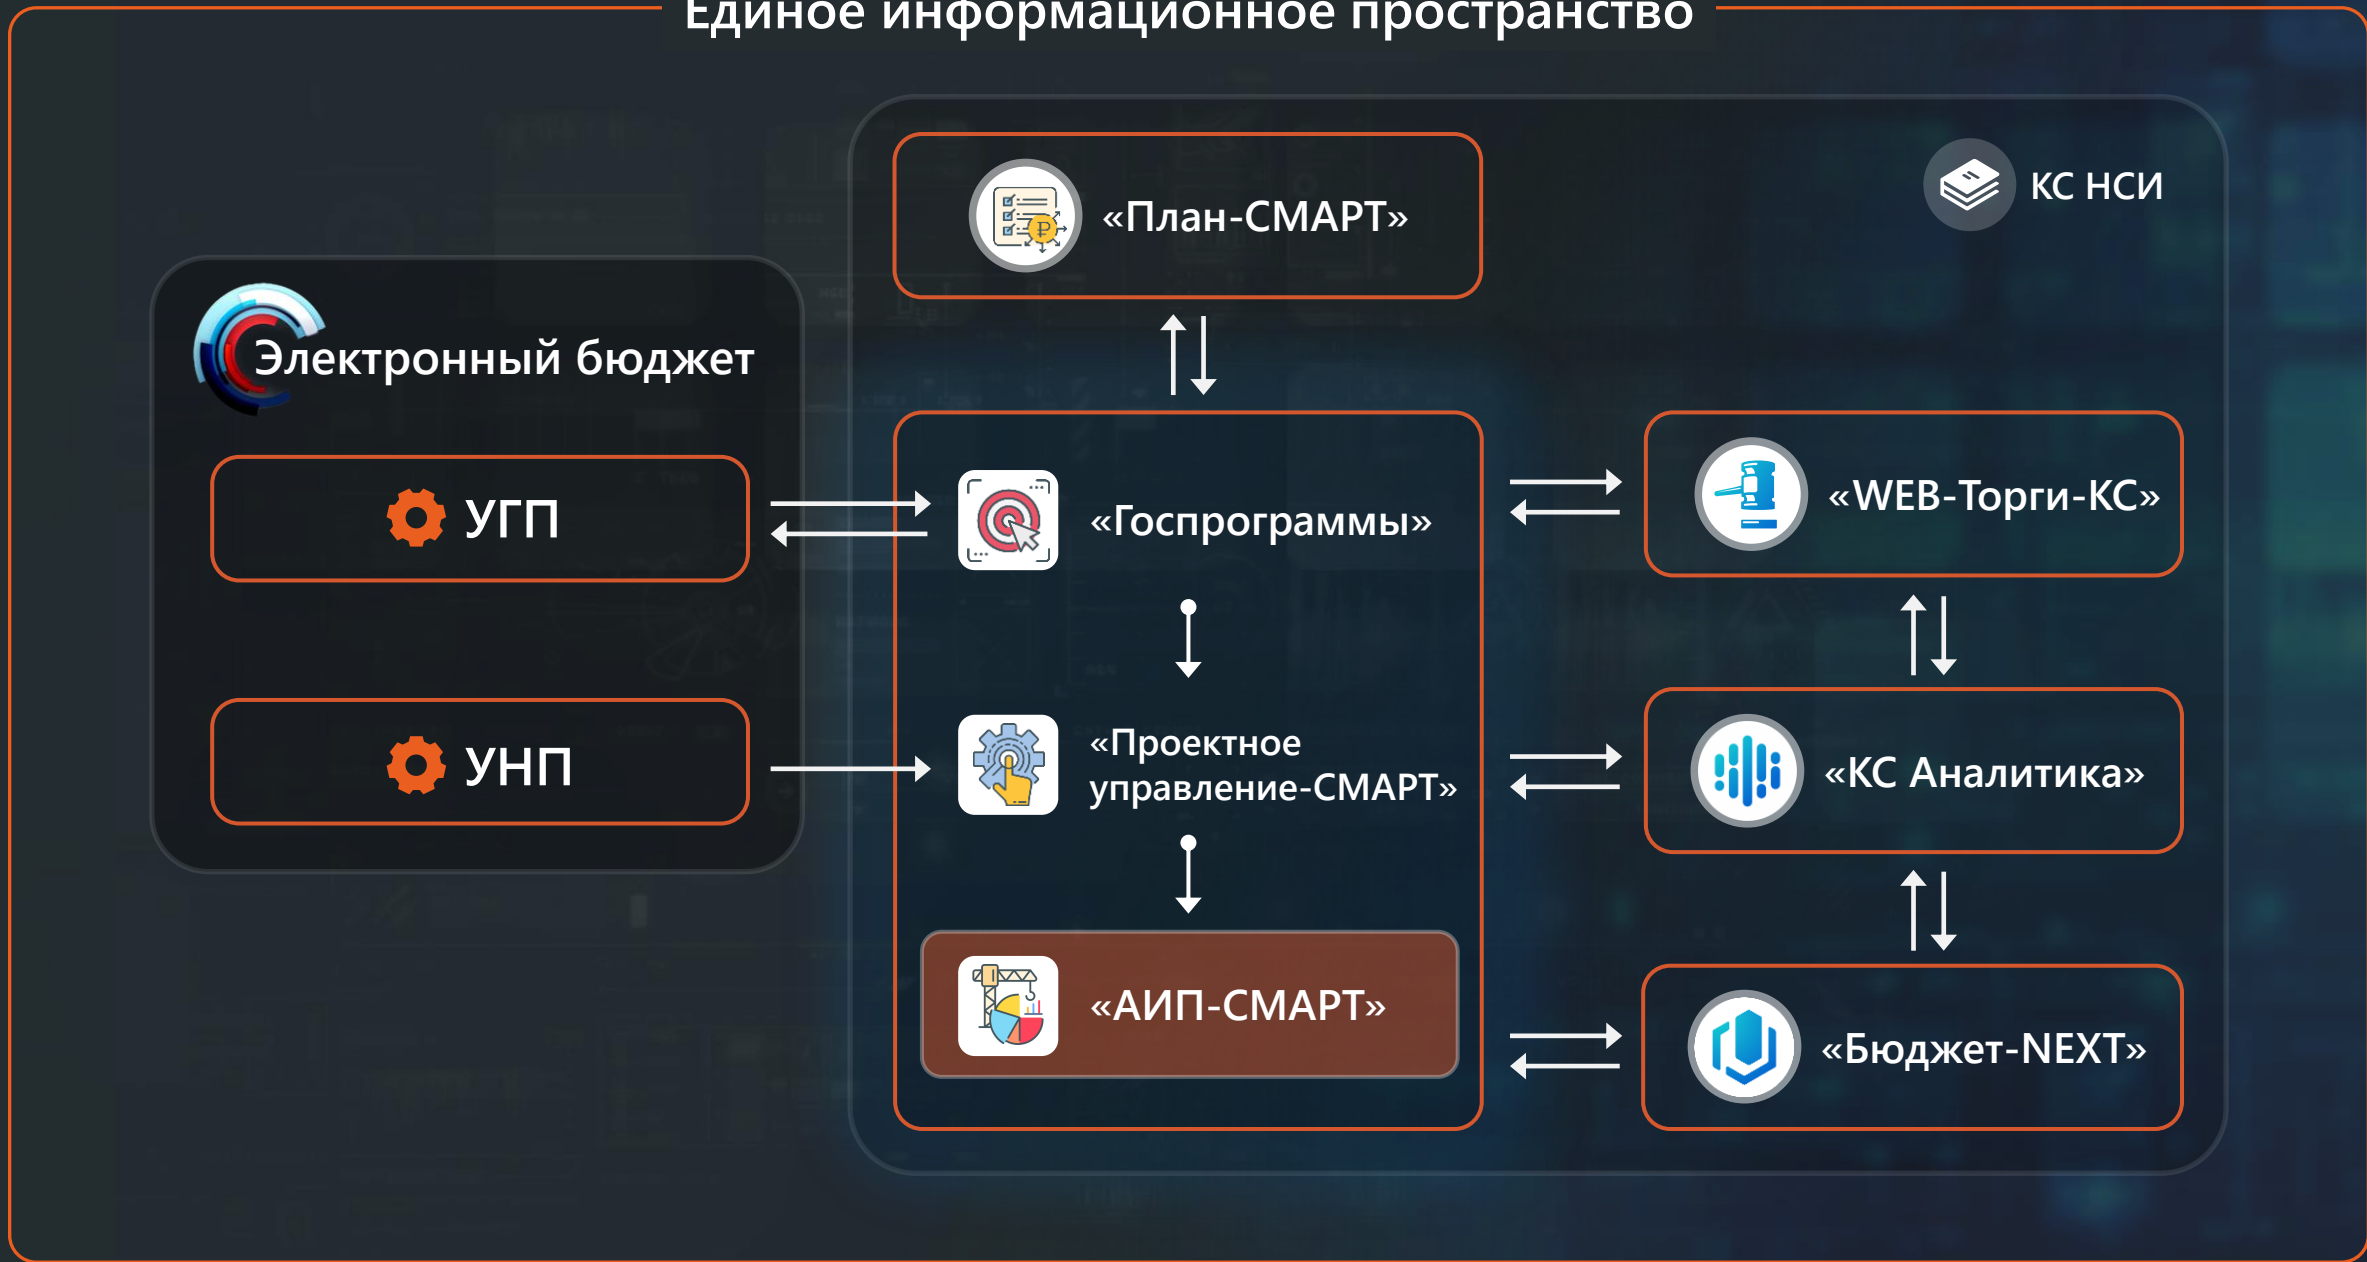

# Преимущества ПК «АИП-СМАРТ»

- ⊕ Сохранение нормативно-правовой базы региона
- ⊕ Формирование отчетных форм в соответствии с методикой региона
- ⊕ Центр контроля корректности ввода данных
- ⊕ Встроенный модуль по управлению бизнес-процессами, который позволяет проводить мониторинг и протоколирование процессов
- ⊕ Централизованный мониторинг всех действий, происходящих в процессе эксплуатации
- ⊕ Качественная техническая поддержка





**КЕЙСИСТЕМС**

**(8352) 323-323**

**[www.keysystems.ru](http://www.keysystems.ru)**



Видеообзор  
«Управление государственными  
программами и проектами»

